

Status strateških projekata

Promjene s obzirom na prethodno izvješće



Ivica Puljak


Četvrtak, 15. studenoga 2023.

Izvješće o statusu strateških projekata

- ▶ POS stanovi i stambeno naselje Korešnica
- ▶ Uređenja Žnjana
- ▶ Tehnološki park Dračevac
- ▶ Izgradnja novih vrtića
- ▶ Izgradnja i dogradnja osnovnih škola
- ▶ Izgradnje i rekonstrukcije garaža
- ▶ Poboljšanje javnog gradskog prijevoza
- ▶ Ozelenjavanje grada i rekonstrukcija tržnica
- ▶ Gospodarenje otpadom
- ▶ Izrada novog PPUG-a i GUP-a i gradski projekti
- ▶ Reorganizacija i digitalizacija gradske uprave

POS stanovi i Korešnica

- ▶ **Korešnica:**
 - Nastavak aktivnosti uređivanja imovinsko-pravnih odnosa
 - Nastavak izrade plana stambenog zbrinjavanja.: zaprimljena tri očitovanja
- ▶ **Nastavljen rad na modelima kroz "Inicijativu 4 grada"**
 - Model gradnje novih stanova za dugoročni najam
 - Model fonda za garanciju iznajmljivanja praznih stanova
 - Modela osiguravanja stanova kroz urbanističke politike
 - Sljedeći sastanak inicijative, uz sudjelovanje EIB-a, u Osijeku

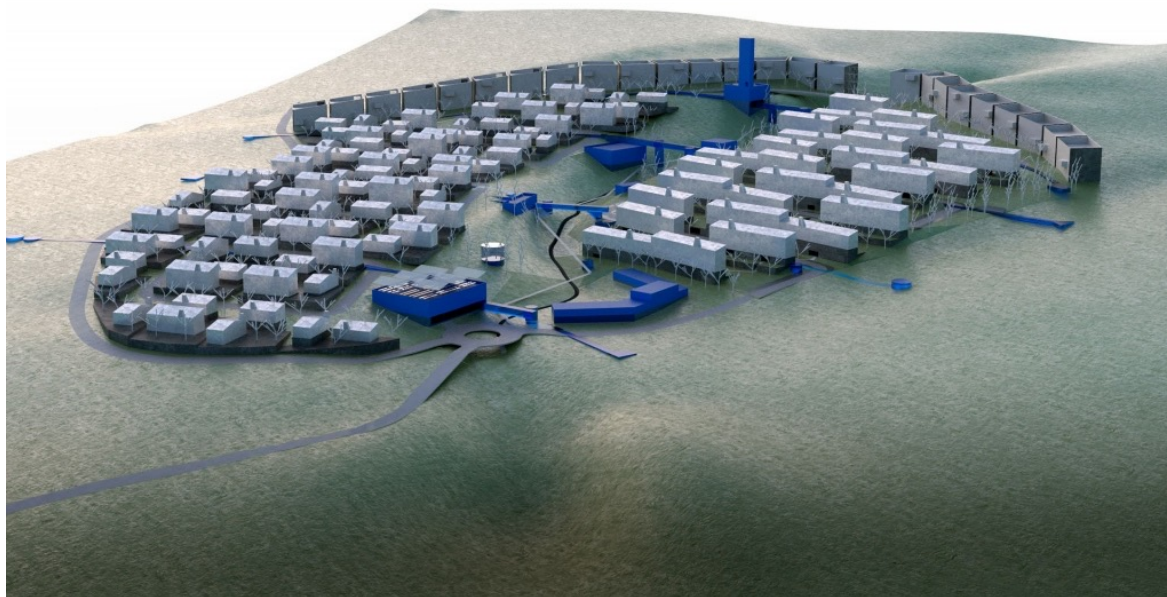


Uređenje Žnjana

► Status projekta

- Financiranje: dodatnih 10 milijuna EUR predloženo u rebalansu
- Ishođenje građevinskih dozvola
 - Ishođene za faze 1 i 2
 - Za faze 3 – 5 u završnim radnjama
- Javna nabava
 - Završna faza pregleda ponuda za izvođača radova
 - Za nadzor 6 ponuđača, ponude se pregledavaju
- Sustav odvodnje Žnjan – Radoševac
 - Radovi završeni
- Započeli radovi na cesti Ivana Pavla II



Izdane pravomoćne građevinske dozvole za najveći dio radova uređenja Žnjanskog platoa



Izdane dozvole za 1. i 2. fazu obuhvaćaju najveći dio radova, a u tijeku je i evaluacija pristiglih ponuda za izvođača radova te za nadzor.

Tehnološki park Split - Dračevac

► **Rekonstrukcija zgrade:**

- Kumulativna vrijednost izvedenih i situiranih radova do kraja **listopada** iznosi **15.539.009,76 €**
- Do kraja listopada izvedeno je, odnosno u tijeku je izvođenje radova po dilatacijama:
 - Dilatacija A i B: Završava se ventilirana fasada na istoku, a na zapadu završena. Aluminijska staklena fasada na istoku je završena, a na zapadu u tijeku. U tijeku je i montaža unutarnjih čeličnih stubišta i unutarnjih i vanjskih ograda, ...
 - Dilatacija C (novi dio zgrade): Podgled na etaži prizemlja se dovršava, izvode se gipskartonski radovi na 2., 3. i 4. katu, ...



► **U tijeku je izvođenje parkinga**

► **Dinamički plan:**

- Prema Dinamičkom planu tehnički pregled predviđen za 15.12.2023.

► **Namještaj i oprema:**

- U tijeku je izrada namještaja, ugradba do kraja godine
- Potpisan je ugovor za nabavu multimedijске opreme, isporuka u tijeku, montaža nakon tehničkog pregleda
- U tijeku je potpis ugovora za Opremanje 3D laboratorija, instalacija do kraja godine



Novi vrti i škole



Novi vrtići i jaslice, školske dvorane

- ▶ DV Pujanke i školska dvorana OŠ Pujanke
 - Objavljen natječaj za izvođenje radova, rok za prijavu 27/11
 - Planira se nadogradnja 5 učionica za prelazak u jednu smjenu
- ▶ DV Kila
 - Kompletirana projektna dokumentacija
 - Ishođenje građevinske dozvole u završnoj fazi, do kraja godine pokretanje nabave
- ▶ DV Pazdigrad
 - Izdana lokacijska dozvola, izjavljena žalba
 - Razgovori s vlasnicima zemljišta u tijeku
- ▶ DV Mertojak
 - Projekt prijavljen na NPOO, izrada glavnog projekta u tijeku
- ▶ Školska dvorana OŠ Stobreč
 - Ishođenje građevinske dozvole u završnoj fazi, uskoro pokretanje postupka nabave
- ▶ Školska dvorana OŠ Sućidar
 - Ishođenje građevinske dozvole u tijeku
- ▶ Školska dvorana OŠ Mertojak
 - Žalba na lokacijsku dozvolu odbijena
- ▶ Meje
 - Podnošen zahtjev za građevinskom dozvolom, uskoro pokretanje postupka nabave

Proširenje škola

- ▶ OŠ Srinjine
 - Razmatra se gradnja nove škole na novoj lokaciji
- ▶ OŠ Lučac
 - Izrađen idejni projekt
- ▶ Centar za autizam
 - Adaptacija dodatnih prostora u Teslinoj ulici u tijeku
- ▶ Projektiranje ostalih osnovnih škola, proširenja, kuhinje, blagovaonice u tijeku
 - Izrada idejnih rješenja u tijeku
- ▶ OŠ Žrnovnica
 - Projektiranje u tijeku
- ▶ DV Žrnovnica
 - Projekt prijavljen na NPOO
- ▶ DV Srinjine
 - Planirano proširenje

Osigurano sufinanciranje energetske obnove Osnovne škole Split 3



Na temelju pozitivne Odluke o financiranju, projekt energetske obnove Osnovne škole Split 3 ostvario je bespovratna sredstva u sklopu *Javnog poziva za energetske obnove zgrada javnog sektora* objavljenog iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. Ukupna vrijednost projekta je 2.309.552,73 €, dok su bespovratna sredstva odobrena u iznosu od 1.784.333,36 €.

- ▶ *Rehabilitacijski centar za djecu i mlade s najtežim oblicima invaliditeta te djecu i mlade s teškoćama u razvoju „Škverska ambulanta“*
 - U tijeku je revizija projektno-tehničke dokumentacije sukladno novim zahtjevima Grada Splita prema projektantima:
 - Izrada idejnog projekta u završnoj fazi
 - Po ishodenim Posebnim uvjetima, provesti će se postupak javne nabave za izradu Glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole te Izvedbenog projekta s troškovnicima za objavu postupka nabave za izvođenje radova
 - Projekt je kao strateški uvršten u Akcijski plan Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split 2021 – 2027
 - Time su osigurana bespovratna sredstva za sufinanciranje njegove realizacije
 - Sporazum o ITU mehanizmu Urbane aglomeracije će se potpisati 30. studenog

Urbana mobilnost

Iz "Plana održive urbane mobilnosti Grada Splita do 2030. godine"



Slika 1. Hijerarhijska piramida održivog prometnog sustava



&



SPLIT
PARKING

Garaže i parkirališta

Garaže i parkirališta

► LOKVE

- Garaža završena i predana gradu
- U tijeku uređenje cijelog kotare Lokve

► DOBRILINA


- U tijeku završni građevinski radovi, hidroizolacije i zasipanja
- Uskoro započinje zadnja faza obrtničko zanatskih radova uređenja garaže.

► ZAGORSKI PUT

- Slijedeći tjedna se pušta polovina etaže A u redovni rad, te kreće druga polovina etaže A.
- Na krovnoj etaži je u toku sanacija. Plan završetka 02/2024

► SMILJANIĆEVA

- Radovi sanacije na krovnoj etaži. Plan završetka 02/2024

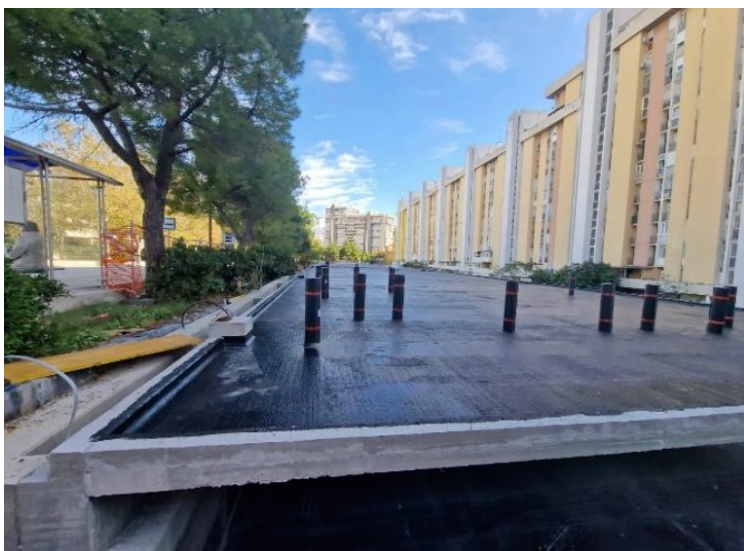


Garaža Lokve dobila uporabnu dozvolu: „Ovo je prva cjelovita garaža izgrađena u Splitu otkako je samostalne Hrvatske“



U prvim danima garaža će biti u probnom radu i dostupna za korištenje svima, a od 1. studenog planiran je početak naplate za pretplatnike.

Krajem idućeg tjedna za korisnike će otvoriti nova garaža Lokve, a nakon što je proteklog tjedna

Uskoro početak gradnje prometnice i javne garaže Trstenik

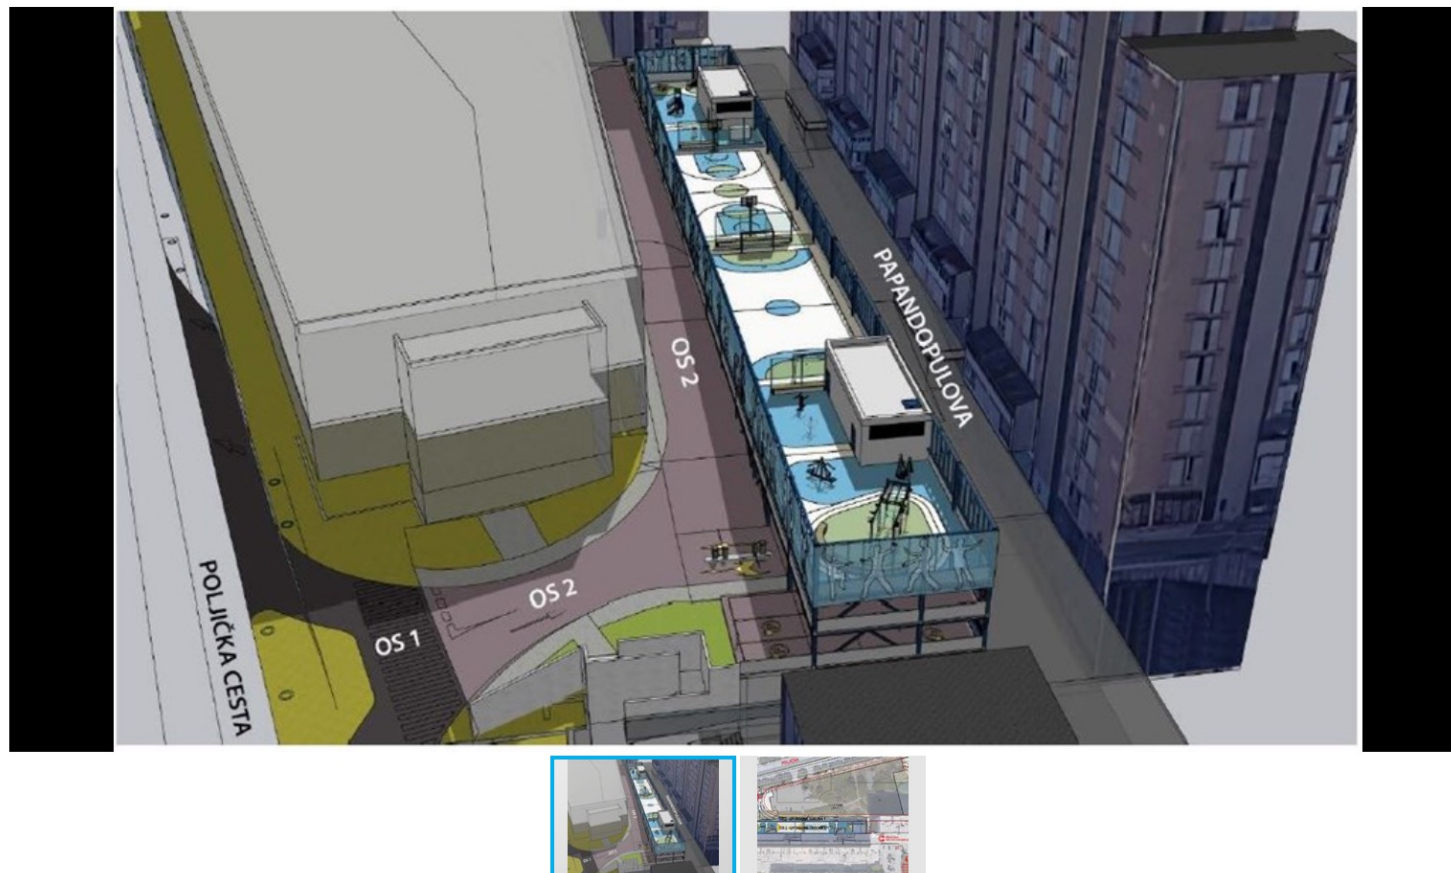

Zbog skorog početka radova na izgradnji prometnice i javne garaže između Poljičke ceste i Ulice Borisa Papandopula u GK Trstenik potrebno je ograničiti pristup gradilištu sukladno čl. 134. Zakona o gradnji, kojim je određeno kako gradilište mora biti ograđeno i osigurano radi sigurnosti prolaznika i sprječavanja nekontroliranog pristupa ljudi na gradilište.

Predstavljen plan gradnje garaža – komunalnih centara: Za grad po mjeri građana, a ne automobila



Gradonačelnik Ivica Puljak predstavio je danas javnosti plan gradnje garaža – komunalnih centara u Splitu.

Slijedi prezentacija
"Plan gradnje garaža –
komunalnih centara u Splitu",
prezentirani javnosti
14. studenog 2023.

Plan gradnje garaža - komunalnih centara u Splitu



**SPLIT
PARKING**



**ST
Ra**
Razvojna
agencija
Split

Utorak, 14. studenoga 2023.

Urbana mobilnost

► Promet, garaže, parkirališta, bicikle ...



Slika 1. Hijerarhijska piramida održivog prometnog sustava

Iz “Plana održive urbane mobilnosti Grada Splita do 2030. godine”

Urbana mobilnost

► Što smo do sada napravili

■ Javni gradski prijevoz

- Novi vozni park → Među najmlađima u Europi
- Novi ticketing sustav → Među najmodernijima u Europi
- Nove gradske linije → Uvođenje počinje za koji tjedan

■ Bicikle

- Daljnji razvoj sustava javnih bicikli
- Uskoro pilot projekt uvođenja romobila

■ Sljedeći važni koraci:

- Intelligent Transportation System (ITS) → Uvođenje u tijeku
- Automobili: garaže i parkinzi → **TEMA DANAS**
- Proširenje pješačkih zona → **USKORO**

Zašto tek danas pričamo o garažama?

HTJELI SMO POKAZATI DA SE MOŽE: GARAŽA LOKVE

PRIMJETITE: OVO NIJE SAMO GARAŽA, VEĆ I KOMUNALNI CENTAR



Garaža – komunalni centar u Dobrilinoj



Naš glavni cilj nisu automobili, niti garaže

► Mi želimo

- Automobile s ulica skloniti u garaže
 - ... i na propisno obilježena parking mjesta
- Osloboditi pločnike i parkove za
 - Pješake
 - Roditelje s djecom
 - Osobe s invaliditetom
 - Kućne ljubimce
 - Zelenilo
 - Biciklističke staze
 - ...

I zato je garaža tek prvi korak



Drugi korak je potpuno uređenje kvarta



PROSTORNA ANALIZA GRADSKIH KOTAREVA I MJESNIH ODBORA S PRIJEDLOGOM INTERVENCIJA

Gradski kotar Lokve: plan potpunog uređenja



MREŽA POLUPODZEMNIH SPREMNIKA ZA OTPAD

PRIJEDLOG PROMETNOG RJEŠENJA – varijanta 2



- REALIZIRANE LOKACIJE
- 1 - Kranjčevića 27
 - 2 - Šižgorićeva 6
 - 3 - Šižgorićeva 18
 - 4 - Šižgorićeva 24
 - 5 - Stepinčeva 27
 - 6 - Stepinčeva 11




→ smjer kretanja
- uz kružnu prometnicu formirano 143 PM

Sada slijedi ...

Plan gradnje garaža – komunalnih centara u gradu Splitu

Kvart	GARAŽA	Tip garaže	Ukupno parking mjesta
Lokve	LOKVE	Nova garaža i centar	200
Split 3	DOBRILINA	Nova garaža i centar	381
Trstenik/Mertojak	PROJEKT ŽNJAN	Nova garaža	530
Trstenik	PAPANDOPULOVA	Nova garaža i centar	350
Split 3	VRANČIĆEVA	Nadogradnja	94
Ravne njive	RAVNE NJIVE	Nova garaža	337
Sućidar	PERIVOJ ANE ROJE	Nova garaža i centar	600
Mejaši	PARK&RIDE LOVRINAC	Nova garaža i centar	1000
Meje	SUSTIPAN	Nova garaža i park	290
Mertojak	OSTRAVSKA	Nadogradnja	100
Spinut	RENDIĆEVA 2	Nadogradnja	107
Pujanke	ZAGORSKI PUT	Nadogradnja	120
Pujanke	DOMOVINSKOG RATA	Nadogradnja	120
Pujanke	TIJARDOVIĆEVA	Nadogradnja	120
Mertojak	DOVERSKA	Nadogradnja	133
Lovret	PARK&RIDE TURSKA KULA	Nova garaža i park	600
Brda	SC BRDA	Nova garaža i centar	300
Spinut	JOBOVA	Nadogradnja ili nova	125
Sućidar	KUKULJEVIĆEVA	Nova garaža	355
Bol	RAVEL	Nova garaža	75
Bačvice	POJIŠAN	Nova garaža i centar	320
Blatine	BLATINE TOPLANA	Nova garaža i centar	240
Split 3	JERETOVA	Nova garaža	450
Split 3	KROZ SMRDECAC	Nova garaža	280
Varoš	KRAGIĆEVA POLJANA	Nova garaža i park	407
Plokite	PLOKITE	Nova garaža i centar	360
Lovret	TRG HBZ	Nova garaža	250
Gripe	OSJEČKA	Nova garaža i centar	220
Trstenik	TRSTENIK ZAPAD	Nova garaža i centar	289
Kman	KMAN 1	Nova garaža	300
Kman	KMAN 2	Nova garaža i centar	360
Varoš/Grad	STARI PLAC	Nova garaža i park	1000
Spinut	SC POLJUD	Nova garaža	800
Lučac-Manuš	SMALL MALL	Privatna/javna garaža	500
Ukupno			11.213

Buduće garaže – pokrivenost grada

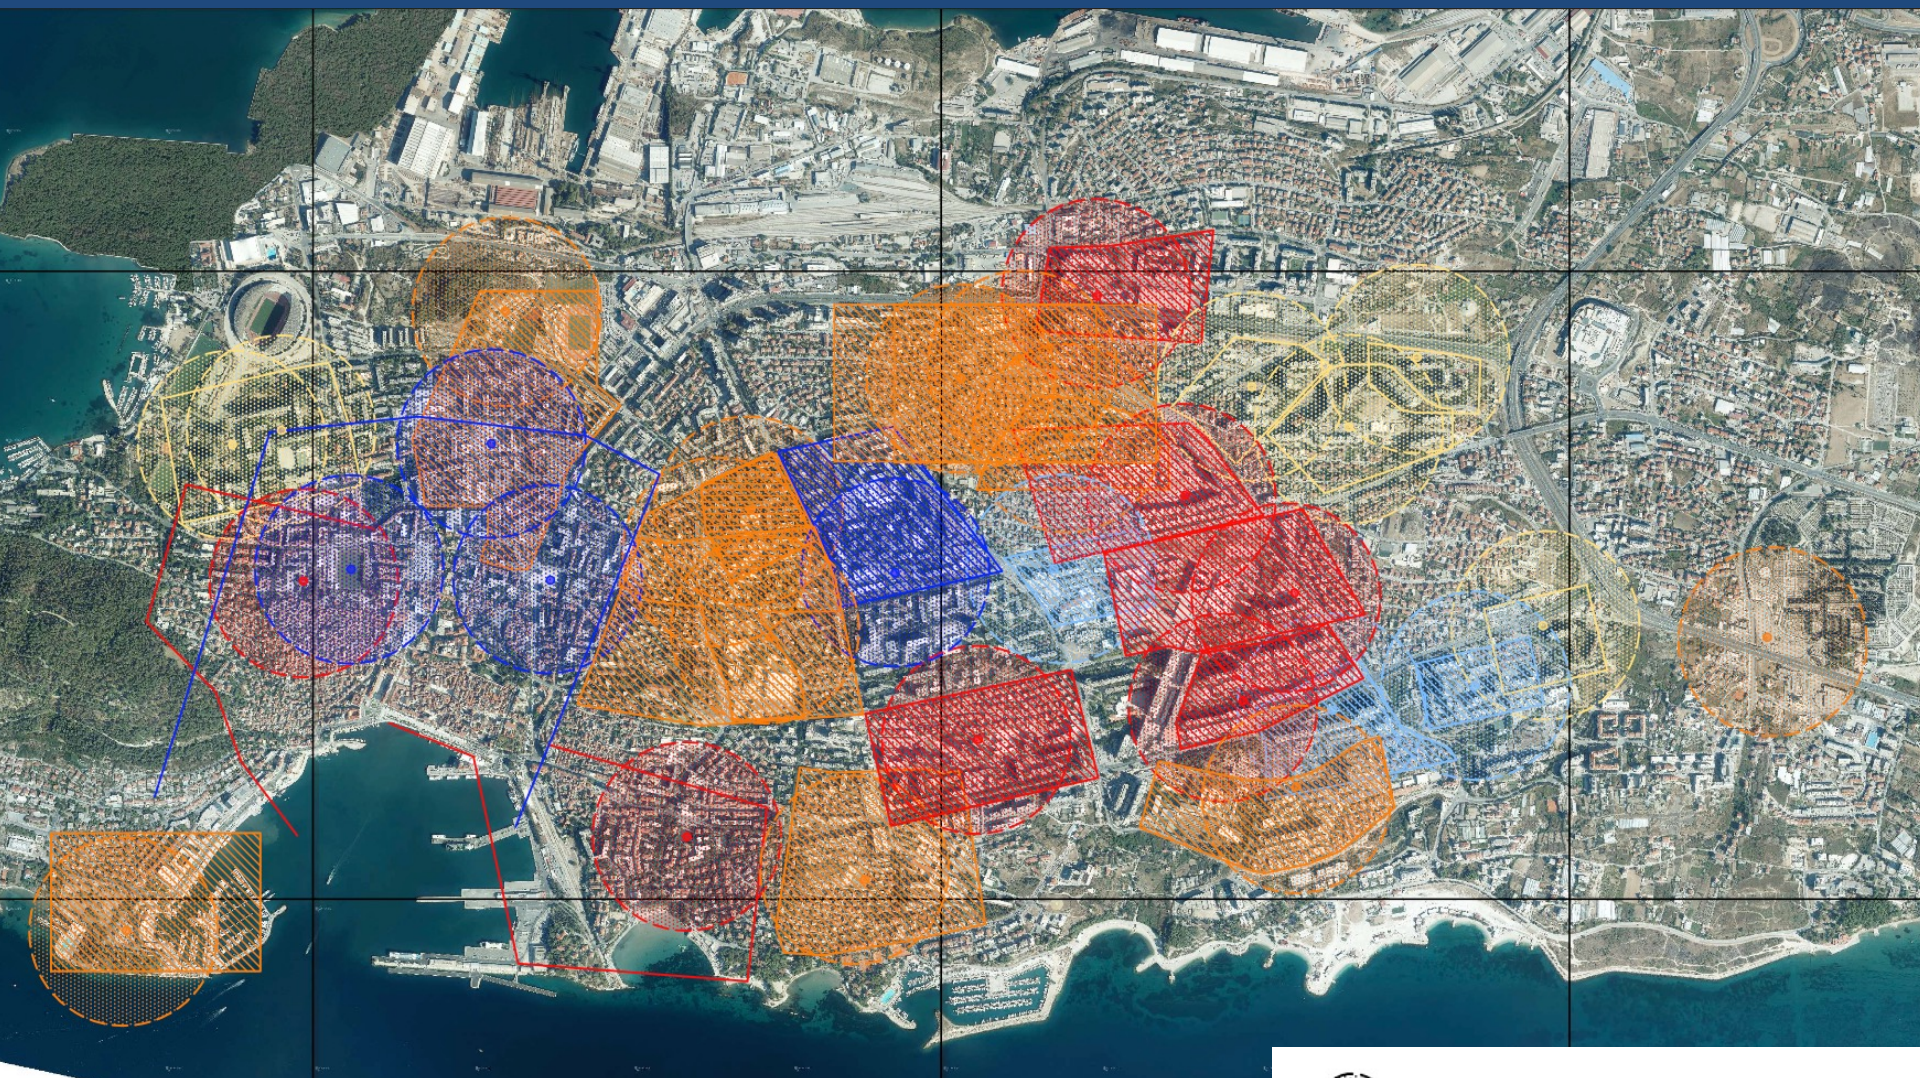

RADIUS 300 M OD OBJEKTA



PODRUČJE KOJE GRAVITIRA OBJEKTU

Završeno i započinje uskoro


Br	Kvart	GARAŽA	Tip garaže	Ukupno parking mjesta	Procijenjena vrijednost investicije	Mjeseci do početka Izvođenja	Mjeseci do realizacije
1	Lokve	LOKVE	Nova garaža i centar	200	3.200.000 €	0	0
2	Split 3	DOBRILINA	Nova garaža i centar	381	4.150.000 €	0	2
3	Trstenik/Mertojak	PROJEKT ŽNJAN	Nova garaža	530	18.000.000 €	2	15
4	Trstenik	PAPANDOPULOVA	Nova garaža i centar	350	6.500.000 €	3	16
5	Split 3	VRANČIĆEVA	Proširenje	94	500.000 €	4,5	9,5
6	Ravne njive	RAVNE NJIVE	Nova garaža	337	5.000.000 €	9	22
7	Sućidar	PERIVOJ ANE ROJE	Nova garaža i centar	600	9.000.000 €	10	23
8	Mejaši	PARK&RIDE LOVRINAC	Nova garaža i centar	1000	20.000.000 €	10	29




Uskoro kreće gradnja u Papandopulovoj



P&R Lovrinac

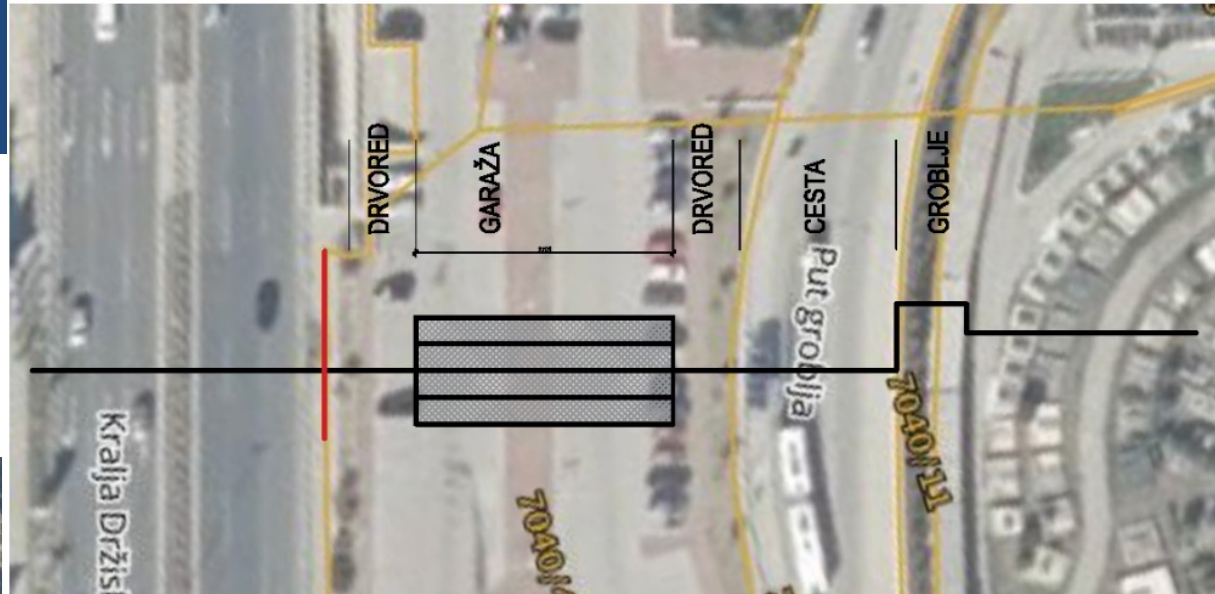

Shematski presjek

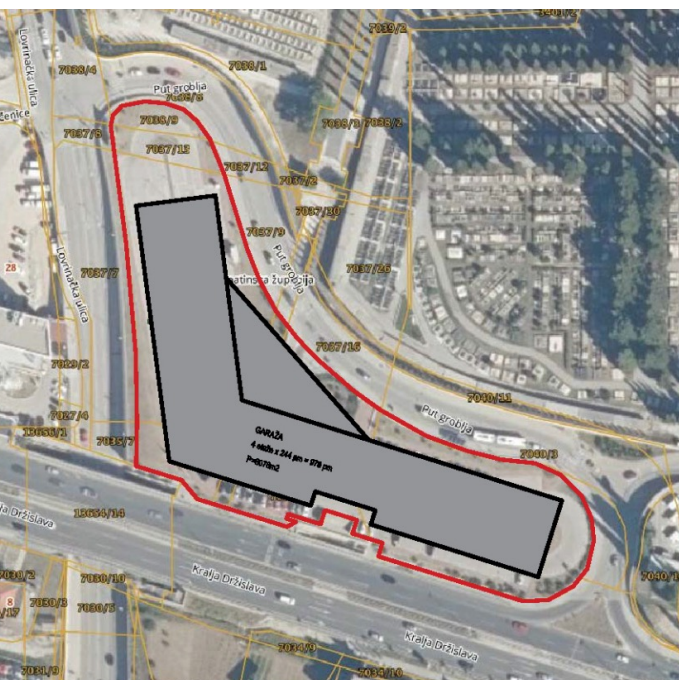


Nakon toga slijedi ...

Kvart	GARAŽA	Tip garaže	Ukupno parking mjesta	Status
Meje	SUSTIPAN	Nova garaža i park	290	Ishođena lokacijska dozvola
Mertojak	OSTRAVSKA	Nadogradnja	100	Naručena statička analiza
Spinut	RENDIĆEVA 2	Nadogradnja	107	
Pujanke	ZAGORSKI PUT	Nadogradnja	120	
Pujanke	DOMOVINSKOG RATA	Nadogradnja	120	
Pujanke	TIJARDOVIĆEVA	Nadogradnja	120	
Mertojak	DOVERSKA	Nadogradnja	133	Naručene studije izvedljivosti
Lovret	PARK&RIDE TURSKA KULA	Nova garaža i park	600	
Brda	SC BRDA	Nova garaža i centar	300	Program natječaja u tijeku
Spinut	JOBOVA	Nadogradnja ili nova	125	Naručena statička analiza




... a zatim ...

Kvart	GARAŽA	Tip garaže	Ukupno parking mjesta	Status
Sućidar	KUKULJEVIĆEVA	Nova garaža	355	Priprema za projektiranje
Bol	RAVEL	Nova garaža	75	Priprema za projektiranje
Bačvice	POJIŠAN	Nova garaža i centar	320	Detaljno ispitivanje lokacije
Blatine	BLATINE TOPLANA	Nova garaža i centar	240	Detaljno ispitivanje lokacije
Split 3	JERETOVA	Nova garaža	450	Detaljno ispitivanje lokacije
Split 3	KROZ SMRDECAC	Nova garaža	280	Detaljno ispitivanje lokacije
Varoš	KRAGIĆEVA POLJANA	Nova garaža i park	407	U okviru natječaja za GP Stari Hajdukov plac
Plokite	PLOKITE	Nova garaža i centar	360	Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa
Lovret	TRG HBZ	Nova garaža	250	Detaljno ispitivanje lokacije

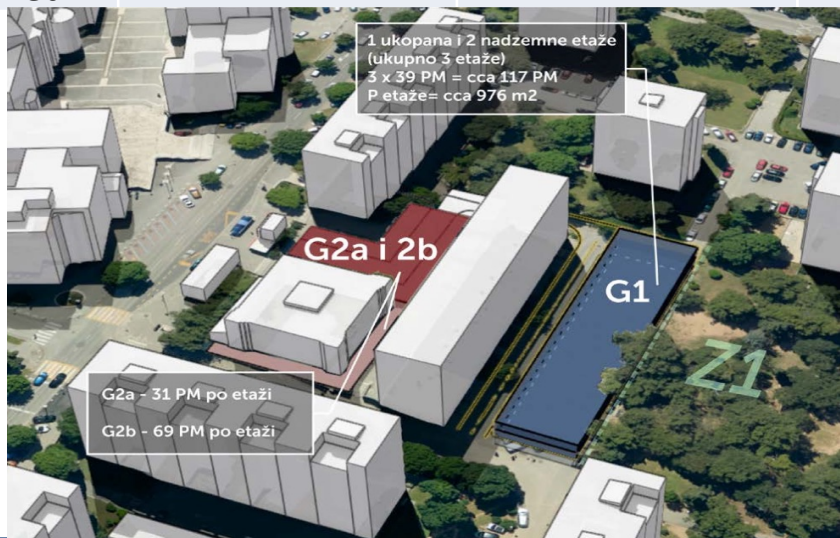

... i na kraju!

Kvart	GARAŽA	Tip garaže	Ukupno parking mjesta	Status
Gripe	OSJEČKA	Nova garaža i centar	220	U okviru natječaja za projekt SC Gripe
Trstenik	TRSTENIK ZAPAD	Nova garaža i centar	289	U okviru natječaja za projekt PZ11
Kman	KMAN 1	Nova garaža	300	Detaljno ispitivanje lokacije
Kman	KMAN 2	Nova garaža i centar	360	Detaljno ispitivanje lokacije
Varoš/Grad	STARI PLAC	Nova garaža i park	1000	U okviru natječaja za GP Stari Hajdukov plac
Spinut	SC POLJUD	Nova garaža	800	U okviru rekonstrukcije stadiona Poljud
Lučac-Manuš	SMALL MALL	Privatna/javna garaža	500	U tijeku

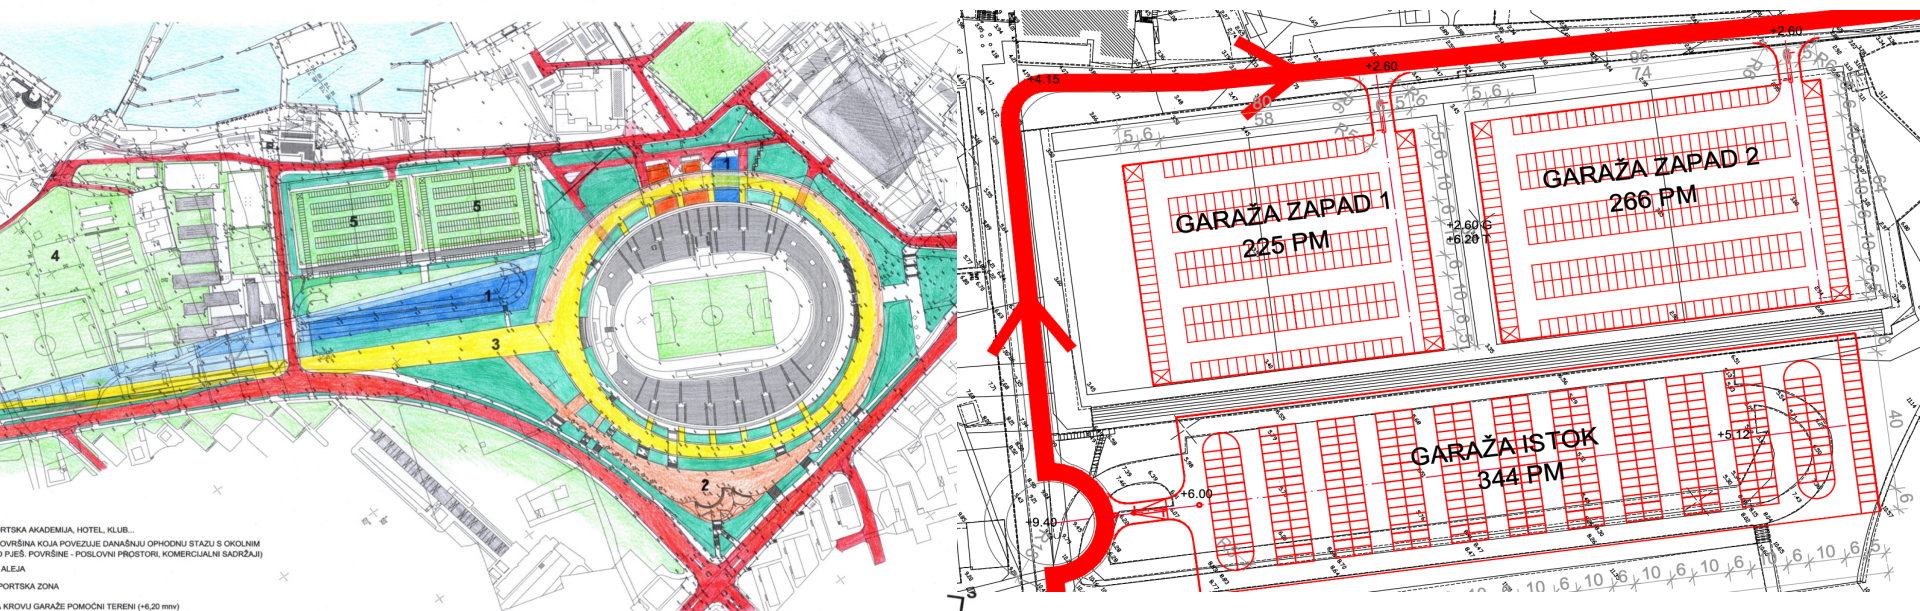

Ali to nije sve ...

- ▶ Ovdje nisu uključene garaže
 - Na Istočnoj obali
 - Gradnja bi mogla početi u 2026.
 - Ispod škola i vrtića
 - Npr ispod škole Meje
 - Gradnja započinje 2024.
 - ... ili ispod vrtića na Pazdigradu
 - Gradnja se planira za 2025.
 - Ispod budućih sportskih centara
 - Mejaši
 - Trstenik zapad
 - Ispod hotela i drugih privatnih investicija

Kako sve ovo financirati

► Razni izvori financiranja

- Vlastita sredstva
- Krediti
 - Grad Split
 - Split parking
- Europski fondovi
 - Za Park & Ride
 - Za komunalne centre i parkove

► Vraćanje kredita

- Od naplate parkinga
- Povećanje kvalitete života i privlačenje investicija

Kvart	GARAŽA	Tip garaže	Ukupno parking mjesta
Lokve	LOKVE	Nova garaža i centar	200
Split 3	DOBRILINA	Nova garaža i centar	381
Trstenik/Mertojak	PROJEKT ŽNJAN	Nova garaža	530
Trstenik	PAPANDOPULOVA	Nova garaža i centar	350
Split 3	VRANČIĆEVA	Nadogradnja	94
Ravne njive	RAVNE NJIVE	Nova garaža	337
Sućidar	PERIVOJ ANE ROJE	Nova garaža i centar	600
Mejaši	PARK&RIDE LOVRINAC	Nova garaža i centar	1000
Meje	SUSTIPAN	Nova garaža i park	290
Mertojak	OSTRAVSKA	Nadogradnja	100
Spinut	RENDIĆEVA 2	Nadogradnja	107
Pujanke	ZAGORSKI PUT	Nadogradnja	120
Pujanke	DOMOVINSKOG RATA	Nadogradnja	120
Pujanke	TIJARDOVIĆEVA	Nadogradnja	120
Mertojak	DOVERSKA	Nadogradnja	133
Lovret	PARK&RIDE TURSKA KULA	Nova garaža i park	600
Brda	SC BRDA	Nova garaža i centar	300
Spinut	JOBOVA	Nadogradnja ili nova	125
Sućidar	KUKULJEVIĆEVA	Nova garaža	355
Bol	RAVEL	Nova garaža	75
Bačvice	POJIŠAN	Nova garaža i centar	320
Blatine	BLATINE TOPLANA	Nova garaža i centar	240
Split 3	JERETOVA	Nova garaža	450
Split 3	KROZ SMRDECAC	Nova garaža	280
Varoš	KRAGIĆEVA POLJANA	Nova garaža i park	407
Plokite	PLOKITE	Nova garaža i centar	360
Lovret	TRG HBZ	Nova garaža	250
Gripe	OSJEČKA	Nova garaža i centar	220
Trstenik	TRSTENIK ZAPAD	Nova garaža i centar	289
Kman	KMAN 1	Nova garaža	300
Kman	KMAN 2	Nova garaža i centar	360
Varoš/Grad	STARI PLAC	Nova garaža i park	1000
Spinut	SC POLJUD	Nova garaža	800
Lučac-Manuš	SMALL MALL	Privatna/javna garaža	500
Ukupno			11.213

VEĆ SMO KRENULI





&

PROMET^{d.o.o.}
Split

Javni gradski prijevoz

- Proces redefiniranja linija u gradu
 - Prijedlog novih linija prezentiran javnosti
 - Stigli prvi autobusi, do kraja godine uvođenje nove linije 3



&



Zelenilo i tržnice

Zelenilo, Tržnice, Rasvjeta

▶ Ušli smo u sezonu sadnji i rezidbi

- Odradili smo 29 špina, 29 klupa, kvartovske mini voćnjake (bile murve i višnje) iz projekta Obnova urbane infrastrukture
- Posadili smo 900/1000 stabala iz Projekta ZaZeleni Split.

▶ Tržnice

- Pazar - sanacija Terena 4 i dijela uz Hrvojevu je predviđena za listopad 2024
- Split 3 - razrada idejnog projekta
- Plokite – detaljni na sljedećoj stranici

▶ Rasvjeta

- U tijeku odabir najboljeg ponuđača, zatražena su pojašnjenja ponuda

▶ Kićenje Grada

- Većina ulica je okićena
- Ostale su Riva, Pjaca (novi materijal), Park na Mertojaku (staro sa Đardina + novi materijal), adventski vijenac ispred sv Frane i jelke

► Odrađeno

- Instalirana nova LED rasvjeta na vanjskoj i unutarnjoj tržnici
- Uređen potpuno novi sanitarni čvor za kupce na istočnom dijelu tržnice
- Uređena zelena površina i prilaz vozilima iz Vinkovačke ulice
- Reguliran pristup vozila dostave i uvedena pješačka zona na području cijelog područja tržnice van vremena dostave
- Postavljen ledomat duplo većeg kapaciteta u hladnjači za ribarnicu
- Postavljeno novo korito od inoxa sa toplom vodom unutar ribarnice
- Postavljene nove bež tende na krovove 30 štandova
- Zamjenjeni svi drveni stolovi na tržnici potpuno novima/ plavima od poliestera (trajan materijal i vrhunski za održavanje)
- Obnovljena hidrantska mreža na tržnici
- Postavljene nove kante i uspostavljen sustav razdvajanja otpada (biootpad, papir i plastika)

► Radi se

- Uređuje se prostor unutar zatvorenog dijela tržnice gdje se nekad nalazio caffè bar, a u koji ćemo smjestiti vitrine za prodaju suhomesnatih proizvoda, sireva, jaja i sl., koji se sada nalaze u prolazu unutarnjeg dijela
- Ugovoreno je projektiranje sanacije krova koje uključuje obnovu krova, svjetlarnika i pripremu krova za solare
Ugovoreno projektiranje solarne elektrane

► U najavi

- Zamjena asfaltne plohe tržnice (prostor koji okružuje zatvoreni dio tržnice, sjeverno, istočno), prilikom radova zamjeniti i šahte, po potrebi i odvođe.
- Na starom vanjskom dijelu tržnice posaditi 14 stabala(murvi) i obnoviti površinu dekorativnim betonom
- Sanacija krova i sve projektirano...



&



Split

Gospodarenje otpadom

Novosti od zadnje sjednice GV

► Ugradnja polupodzemnih spremnika

- Sredinom listopada započeli smo s novom fazom postavljanja polupodzemnih spremnika (plan je do kraja ljeta 2024. postaviti dodatnih 400 spremnika).
- Spremnici su tijekom listopada i studenog ove godine postavljeni na dvanaest novih lokacija, kako slijedi: **7 lokacija na području GK Lokve (Stepinčeva 41, Stepinčeva 71, Stepinčeva 20, Vukovarska 106, Stepinčeva 2, Kranjčevićeva 22, Dubrovačka 26), 3 lokacije na području GK Gripe (Osječka 24a, Osječka 28, Pupačićeva 1) te po jedna lokacija na području GK Split 3 (Jeretova 1) i GK Lovret (Sukoišanska 28).**
- Slijedi više lokacija na području GK Lovret. Također, zbog potreba građana dodana su dva dodatna spremnika na postojećoj lokaciji kod tržnice Split 3.

► Novosti od posljednjeg gradskog vijeća

- Trenutno posjedujemo tri specijalna vozila za pražnjenje polupodzemnih spremnika.
 - Danas će biti objavljen natječaj za nabavu još dva dodatna specijalna vozila za pražnjenje istih spremnika.
 - Potpisan je i ugovor za prenamjenu vozila *smećar* u *samopodizač*.
- Slijede natječaji za nabavu specijalnog radnog vozila *navlakač* te za prenamjenu drugog radnog vozila.
- Završen je proces certifikacije ISO standarda 9001, 14000 i 45000.
- U tijeku je natječaj za radno mjesto automehaničara te interni natječaji (unutar firme) za radna mjesta bravara, gumara, vozača teretnog vozila, radnika na odlagalištu otpada i u reciklažnom dvorištu te pomoćnog radnika.
- Obavljena je donacija 50 metalnih kontejnera od 1100 litara mostarskoj komunalnoj tvrtki JP Parkovi i građanima Mostara.

Kontinuirane aktivnosti

- ▶ **Podjela kanti** za reciklabilni otpad (papir i plastiku) je i dalje u tijeku
 - Dosad je podijeljeno oko 13 300 individualnih spremnika za papir i plastiku te ranije 9000 za biootpad. Kontinuirano se obavlja zamjena oštećenih spremnika.
 - Podjelom velike količine reciklabilnih spremnika ne koristimo više skladište Donita za koje smo dosad plaćali najam.
- ▶ U tijeku je je **provjera funkcionalnosti informacijskog sustava za elektronsku identifikaciju posuda i kontejnera za otpad** odnosno evidenciju pražnjenja posuda sustava
 - Sustav objedinjuje elektroničke komponente koje su ugrađene na vozilo za sakupljanje i odvoz otpada i softver – programsku aplikaciju za prikaz i administraciju podataka.
 - Elektronska identifikacija vrši se pomoću RFID čipova (tagova) koji se ugrađuju u posude i kontejnere za otpad.
 - Sustav očitava tagove automatski, putem RFID antena instaliranih na hidrauličkom podizaču vozila za sakupljanje otpada ili putem ručnog bežičnog RF RFID/barcode.
- ▶ **Stroj za baliranje** je ranije isporučen Čistoći
- ▶ **Droblilica za glomazni otpad** je također isporučena krajem listopada
 - U tijeku je izrada potrebnih elaborata i dokumentacije potrebne za rad navedenih strojeva kao i biostabilizatora.
- ▶ U suradnji s udrugama i klubovima sudjelovali smo u listopadu i studenom u nekoliko **ekoloških akcija**
- ▶ Grad je za potrebe Čistoće, s ciljem poboljšanja prikupljanja reciklabilnog otpada, aplicirao na natječaje Fonda (pametni spremnici za odvojeno prikupljanje papira i plastike-po 10 kom, spremnici za staklenu ambalažu-120 kom) te su sredstva odobrena.
 - Slijede **natječaji za nabavu navedenih spremnika**.
- ▶ Odradili smo **nekoliko edukativnih radionica** za učenike OŠ Brda.
 - U planu su i druge obrazovne ustanove i institucije.



Sanacija Karepovca

- ▶ *Radovi na sanaciji Karepovca se odvijaju po planu, sukladno ugovoru*
 - *Preostalo je za završiti hidrosjetvu i sadnja 180 stabala*
- ▶ *Planirani kraj završeta radova na ovoj fazi je do kraja godine*
- ▶ *Radovi izgradnje pogona „plinske baklje“ na Karepovcu odvijaju se po planu*
 - *Postrojenje plinske baklje je montirano, a u tijeku su završni radovi uređenja okoliša*
 - *Planirani rok završetka je do kraja godine*
- ▶ *Razmatraju se različita rješenja eventualne potrebe izgradnje prečišćivača otpadnih voda*
 - *U izradi je projektni zadatak za nabavu projekta kompletnog sustava.*

GUP, gradski projekti

► Izrada izmjena i dopuna PPUG-a i GUP-a

- *Zavod za prostorno uređenje Grada Splita dobio licencu za izradu Prostornih planova svih razina, te se aktivno uključio u izradu izmjena i dopuna PPUG i GUP*
- *Plan: do kraja godine otvori javni uvid, konačni prijedlog do 3. mjeseca 2024.*

► Gradski projekti

▪ **GP ISTOČNA OBALA**

- *nakon provedenog brojanje prometa, kao empirijske stručne podloge za odabir konačne prometne varijante, u izradi je mikrosimulacijski model mogućih prometnih rješenja, naručen od FGAG, te priprema idejnog rješenja za proširenje mosta u Jadranskoj ulici, i interventnog prometnog pravca prema šetalištu Petra Preradovića.*

▪ **GP KOPILICA**

- *Izrađene su programske smjernice*
- *Kao pripremu za prethodne konzultacije sa HŽ, HC i LUS, obavljeni razgovori u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture RH, radi usklađivanja daljnjih aktivnosti s projektima infrastrukturnih državnih sustava, i to:*
 - *prometni koridor povezivanje čvora Vučevica na Autocesti sa Gradskom Lukom Split, uključivši i planirani most preko Kaštelanskog zaljeva*
 - *izgradnja željezničkog kolodvora Kopilica*
 - *izgradnja Luke Stinice*
- *Nakon ovih konzultacija i paralelno uz njih, slijedi šira stručnu raspravu kao pripremu za izradu Programa natječaja.*

- *Za **GP Poljud, Brodarica i Stari Hajdukov Plac** izrađuju se programske smjernice za provedbu anketnih urbanističko-arhitektonskih natječaja*

Ostalo

Vratija se Šunje: S puno emocija uz pučku feštu otkriven Smojin spomenik na Matejuški



Unatoč nepovoljnim vremenskim prilikama, danas poslijepodne, uz bogati program splitskih tradicijskih društava pod nazivom „Vratija se Šunje“, na Matejuški je otvoren spomenik najvećem kroničaru Splita i cijele Dalmacije, Miljenku Smoji. Pred brojnim okupljenim građanima Splita, čast da spomenik otkrije pripala je unuku Bogdana Kragića, najstarijeg živućeg nogometaša Hajduka, Zlatku Vujoviću.
